提案依頼書（RFP）

SOMPO ケア　AI 戦略における導入･開発支援

2025 年 11 月 7 日

SOMPO ケア株式会社

目次

１．はじめに

１．１．プロジェクトの背景

１．２．プロジェクトの目的

１．３．本 RFP の目的

２．プロジェクト概要

２．１．推進体制とプロジェクト構成

２．２．プロジェクト推進方針

２．３．プロジェクト推進における現状の課題

３．提案依頼事項

３．１．AI 活用を前提とした AI-Ready 環境構築への支援

３．２．個別プロジェクトにおけるビジネス部門要件定義への支援

３．３．プロジェクト全体のマネジメント支援

４．期待する成果物

５．提案に含めていただきたい事項

６．提案書類提出要領

１． はじめに

１． １．プロジェクトの背景

少子高齢化の進展や出生率の低下に伴い、高齢者人口が増加する一方で、支える側である現役世代の減少が進行し、人手不足が日本社会全体の大きな課題となっています。介護業界でも、**2040 年には介護人材が 57 万人不足すると予測**されており、足元では **2023 年に初めて介護職員数が減少**するなど、人手不足の波は既に顕在化しています。

このような環境下において、他業界では価格改定やデジタル・データ・AI の活用による生産性向上が進んでいますが、社会保険制度である介護保険の枠組みの中で運営される介護業界では、価格転嫁が極めて困難な状況です。また、施設介護・在宅介護ともに高齢者の「生活」を支えるサービスであることから、一定の手厚さが求められる点も介護特有の特徴です。

したがって、サービス品質を維持しながら生産性を高めることが必要であり、その一つの有効な手段として AI 活用に活路を見出したいと考えています。

当社では今年度を**「AI 共創元年」**と位置づけ、AI 活用を経営の最重要施策として全社横断で強力に推進します。本プロジェクトは、17 個の AI 推進プロジェクトを具体化し、全社の業務変革を実現するものです。

１．２．プロジェクトの目的

2030 年の目指す姿は、「AI をフル活用した未来の介護モデルの構築」であり、AI を活用することで、現場の生産性向上、本社の業務改革、ノウハウの事業化、新サービスの創造を実現し、介護付きホームにおける「人員配置 3：0.9 の達成（その先も含む）」や、在宅介護における「収益性の向上」、本社部門における「既存業務 50%削減」を目指しています。

その達成に向け、経営にて絞り込んだ優先取組み項目は、以下の 6 点です。

No.	優先取組項目	概要
Ⅰ	ケアプラン・記録	ケアプラン、モニタリングの自動化 ➢ 計画作成、不備検知 ➢ 画像、音声データによる行動記録自動化
Ⅱ	ケア業務（事故・NC）	虐待、事故、ナースコール対応の業務支援 ➢ リスク検知(AI カメラ)、法定帳票自動作成 ➢ ナースコールの初期自動応対
Ⅲ	食事・栄養	AI 食札等による安全性の向上と業務効率化 ➢ 献立の自動作成 ➢ 画像認識による検膳、喫食量測定
Ⅳ	バックオフィス業務	業務プロセスの改革 ➢ 介護保険請求、経費精算、問合わせ対応自動化 ➢ 介護保険請求の返礼、減算リスク検知
Ⅴ	専門業務	人事、法務、経理、企画領域の業務標準化、高度化 ➢ AI マッチング、退職リスク検知、リーガルチェック ➢ 予算作成、業績管理の AI 活用
Ⅵ	基盤整備	職員の AI 活用常態化 ➢ SOMPO AI アシスタントの全社導入、活用 ➢ 議事録の自動作成、RAG 環境の構築

１．３．本 RFP の目的

本提案依頼書は、当社の AI 戦略を円滑に始動させ、早期に各種 AI 活用プロジェクトの立ち上げおよびプロダクトの開発・導入を実現することを目的として作成したものです。

本プロジェクトは**全社を挙げた最重要プロジェクト**であり、この強力な推進体制の下、プロジェクトを成功に導くため、AI 導入に関する高度な専門性と豊富な実績を持つ外部コンサルタントを PMO パートナーとして招聘します。

戦略策定から実行支援までを一貫して担い、知識・技術・人的リソースなどのケイパビリティを補完し、当社の限られたリソース（主要メンバー稼働率 30-50%）を補完し、ハンズオンでプロジェクトを推進していただける最適な事業者を選定します。

2．プロジェクト概要

■プロジェクト名：SOMPO ケア　AI 共創プロジェクト

2．1．推進体制とプロジェクト構成

社長をトップとした推進体制を構築し、上記 1.2.に示す 6 つの優先取組み項目を踏まえ、「コアソリューション」「費用対効果」「拡張性」の観点から、17 個の推進プロジェクトを組成・推進していく方針です。

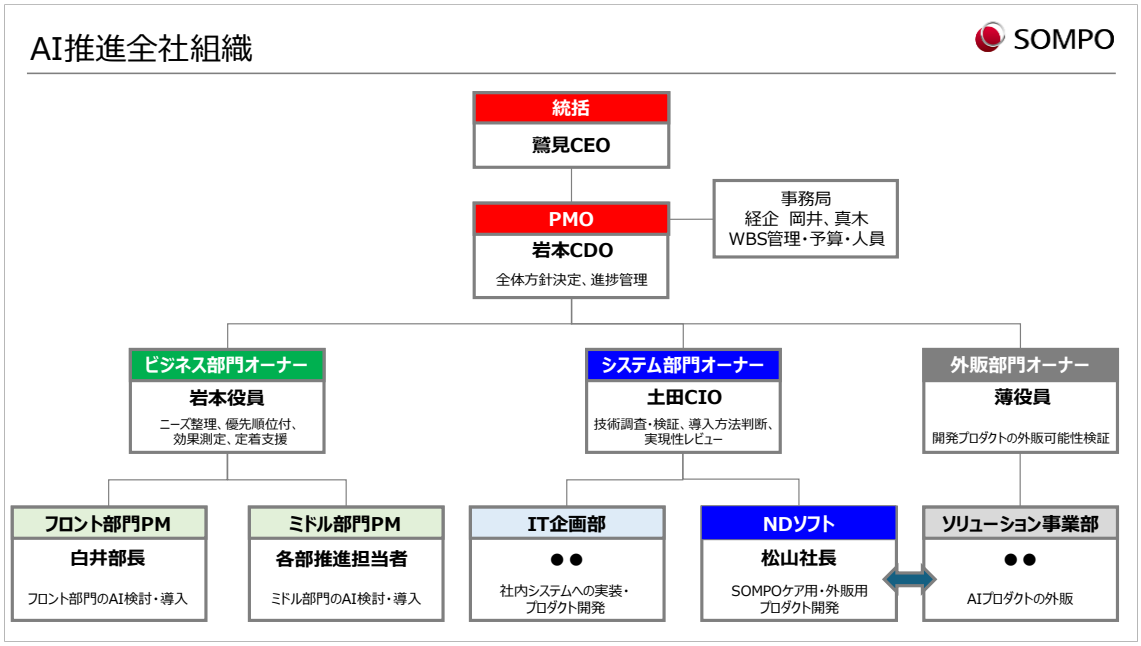

意思決定プロセス

- ■ 最終意思決定者：　鷲見 CEO
- ■ 意思決定機関　：　SOMPO ケア　経営会議　等

プロジェクト期間

- ■ フェーズ 1：2025 年 11 月（契約後）～2026 年 2 月末
  AI-ready 化とロードマップ策定（本 RFP の直接スコープ）
- ■ フェーズ 2 ：2026 年 3 月以降～
  PoC の実施と全社展開（継続支援を前提）

AI 推進プロジェクト一覧

No.	プロジェクト名	優先取組項目
①	AI ケアプラン	Ⅰ.ケアプラン/記録
②	運営状況指標	Ⅵ.基盤整備
③	記録の自動化（音声記録）	Ⅰ.ケアプラン/記録
④	AI カメラ（事故検知・報告書作成）	Ⅱ.ケア業務（事故・NC）
⑤	シェアードサービス部　申請問合わせ自動化	Ⅳ.バックオフィス業務
⑥	シェアードサービス部　業務自動化	Ⅳ.バックオフィス業務
⑦	社内浸透	Ⅵ.基盤整備
⑧	議事録自動作成	Ⅵ.基盤整備
⑨	AI　ready 構築　➡　社内問合わせ自動化	Ⅵ.基盤整備
⑩	経費処理の自動化	Ⅳ.バックオフィス業務
⑪	定型文書の自動作成	Ⅳ.バックオフィス業務
⑫	ソリューション営業	Ⅴ.専門業務
⑬	人材採用	Ⅴ.専門業務
⑭	コンタクトセンター自動化	Ⅳ.バックオフィス業務
⑮	AI カメラ拡張	Ⅱ.ケア業務（事故・NC）
⑯	献立自動作成	Ⅲ.食事・栄養
⑰	食事提供	Ⅲ.食事・栄養

２．２．プロジェクト推進方針

プロジェクトの基本的な推進方針としては、以下のフェーズで進めていくことを想定しています。

■ **フェーズ 1：AI-ready 化とロードマップ策定**（本 RFP の直接スコープ）
2025 年 11 月（契約後）～2026 年 2 月末

■ **フェーズ 2：PoC の実施と効果検証**
2026 年 3 月～

■ **フェーズ 3：導入プロダクトの決定と全社展開 PoC の実施と効果検証**
フェーズ 2 以降、順次

なお、プロジェクトごとに進捗状況や課題、ビジネス部門・システム部門のキャパシティは異なっており、一部、先行して PoC を既に実施しているプロジェクトもございます。

また、実際に導入をする際には、複数の PoC が走る可能性があり、介護現場における負荷の増大も懸念されるため、フェーズ 2 はプロジェクトごとに開始時期が後ろ倒しになる可能性がございます。

そのため、上記方針は大枠のタイムラインであることをお含みおきください。

AI-ready 化の定義

AI をフル活用するためには、AI が参照しやすい環境整備が不可欠です。そのためには、社内に散在しているマニュアル等の整備（ソフト面の AI-Ready）と、AI が参照・自律的に動くための環境整備（ハード面の AI-Ready）を進める必要があります。
本プロジェクトにおける AI-Ready 化（ソフト・ハードのいずれかか共通）のゴールは、AI によるアウトプット・処理の品質改善体制（ビジネス・IT）の構築になります。

ソフト面の AI-Ready

- 社内に散在しているマニュアル等の整備
- 業務手順書・規程・ノウハウの体系化
- データの統一化・標準化
- 世代管理・更新ルールの確立
- AI が理解しやすい形式への変換

ハード面の AI-Ready

- RAG 環境の構築
- マネージドデータストアの整備
- ベクトル埋め込み技術の導入
- 既存システムとの連携基盤
- セキュリティ・ガバナンス体制

２．３．プロジェクト推進における現状の課題

現在、当社では複数の AI 関連プロジェクトを推進しようとしておりますが、AI 活用を進める中でいくつかの課題が明らかになってきています。

一つ目の課題は、AI を活用するための前提となる AI-ready 環境（データ整備・基盤構築・運用ルール等）の構築をどのように進めるべきかに関する知見が不足している点です。また、各種マニュアルなどが体系立て・世代管理がされていないことも課題です。

二つ目の課題は、ビジネス部門におけるキャパシティおよび知識・経験の不足により、システム開発における要件定義が十分に行えず、AI 活用の検討を具体化できていない点です。

三つ目の課題は、各プロジェクトを横断的に統括する人材の知識・経験・ノウハウの不足により、全体把握や PMO 機能に脆弱性がある点です。

四つ目の課題は、技術スキル不足です。社内に AI モデルの運用・カスタマイズ・インテグレーションを担当できる技術者が現状ゼロの状態です。**特に、後述する Gemini Enterprise を含む Google サービス全般の有識者が社内にいません。**

以上の点が、当社において AI 活用を推進していく上で顕在化している主要な課題であり、これらの解決に向けた支援をコンサルティングパートナーに求めています。

3． 提案依頼事項

以下のタスクについて具体的な実行計画と手法をご提案ください。2026 年 4 月からの SOMPOHD がグループ各社に提供予定の Google Gemini Enterpraise（以下、Gemini Ent.）導入は決定事項であることを前提とした、現実的かつ効果的な提案を求めます。

（1）AI 活用を前提とした AI-Ready 環境構築への支援

【前半（計画策定と PoC 準備）】～2025 年 12 月末

(1) AI-ready 化の現状アセスメント

- 社内データ・マニュアルの散在状況の把握と課題の洗い出し
- Gemini Ent.活用に向けたデータ整備の要件定義
- 既存システム（Garoon 等）との連携方式の調査・検証
- 既存システムとのデータ連携可能性の評価

(2) AI-ready 化ロードマップの策定

- **ソフト面：**マニュアル等の整備計画（優先順位、整備方法、スケジュール）
- **ハード面：**RAG 環境構築の技術アーキテクチャ設計
- Garoon 環境との連携方式、または、補完的な SaaS/ツールの活用方針
- 必要なリソース（人材・予算）の明確化と AI エンジニア・運用担当の調達準備

(3) PoC 計画の策定

- PoC 対象領域の選定（優先度の高い業務プロセス）
- 詳細な PoC 実施計画（目的、スコープ、評価指標、スケジュール）
- PoC 環境の要件定義

【後半（PoC 実施）】2026 年 1 月～2 月末

(1) 2026 年 4 月からの Gemini Ent.を見据えた PoC 環境の構築

- RAG 環境の構築（マネージドデータストア、ベクトル埋め込み等）
- セキュリティ設定

(2) マニュアル等の整備支援

- 社内に散在しているマニュアル等の整備支援（優先度の高い領域）
- AI が参照しやすい形式への変換・体系化の支援

- 世代管理・更新ルールの策定支援

(3) PoC 実施と効果検証

- 選定した業務プロセスでの簡易的な AI エージェント構築
- 効果測定と課題の抽出

(4) 次年度展開計画の策定

- PoC 結果の評価と本格導入に向けた提言
- 2026 年度の詳細実行計画・予算計画

※重要：当社には Gemini Ent.の有識者がいないため、計画策定だけでなく実装を含めた支援が必須です。

技術環境

- **<u>2026 年 4 月から Gemini Ent.導入は決定事項</u>**
- グループウェアは**サイボウズ Garoon 5** を利用
- ファイルサーバー：Data ONTAP Release 9.10.1P12: Thu Apr 13 00:30:59 UTC 2023 (Fujitsu)×2　総容量：360TiB

  全社ファイルサーバー：論理利用量 49TB（Windows からプロパティで確認）

  物理利用量 29TiB（ONTAP 管理画面から利用量を確認）

  個人領域：論理利用量：12TB

  物理利用量：11.5TiB

  ※：個人領域は 1 人当たり 100GB でクォーターを設定。

  （データ量は 2025 年 3 月末時点）
- **<u>Google Workspace や Google Cloud は利用していない</u>**

（２）個別プロジェクトにおけるビジネス部門要件定義への支援

具体的には、現行業務のフロー化、作業時間・工数実態把握、ボトルネックの特定を行ったうえで、AI・デジタル技術の活用による効率化余地を定量的に評価・提言をいただくことを想定しています。

また、評価・提言結果に基づき、今後実行可能なロードマップ（タイムライン・KPI、概算効果・コスト）策定への支援を想定しています。

なお、支援を想定しているプロジェクトは以下の 7 つです。

①AI ケアプラン

②運営状況指標

④AI カメラ（事故検知・報告書作成）

⑥シェアードサービス部　業務自動化（★）

⑪定型文書の自動作成（★）

⑭コンタクトセンター自動化（★）

⑰食事提供

プロジェクトにより、進め方も異なってくるため、1 つの個別プロジェクトを支援する場合を想定し、ご提案ください。

★：AI-Ready 環境構築と連動性あり

（３）プロジェクト全体のマネジメント支援

当社が推進する AI 活用プロジェクトに対して、横断的な AI 推進基盤（PMO 機能・知見共有・標準化・成果管理）を構築・運営する支援。各プロジェクトが個別最適に陥ることを防ぎ、全社最適の観点から AI 共創プロジェクトの成果を最大化するための支援を想定しています。

また、部門横断での会議体の設計・ファシリテーション、および関係者間の円滑なコミュニケーション促進と合意形成の支援も想定しています。

４．期待する成果物

（１）AI 活用を前提とした AI-Ready 環境構築への支援

前半完了時：

1. AI-ready 化 現状アセスメントレポート
2. AI-ready 化ロードマップ（ソフト面・ハード面）
3. 技術アーキテクチャ設計書（既存システム連携方式を含む）
4. PoC 実施計画書(必要リソース・予算含む)

後半完了時：

1. PoC 環境構築完了報告書（構築手順書含む）
2. PoC 実施報告書（効果測定結果、課題整理）
3. 2026 年度展開計画書

（２）個別プロジェクトにおけるビジネス部門要件定義への支援

１．対象プロジェクトにおける業務プロセスの可視化
２．AI・デジタル活用による効率化余地の評価
３．利用可能な AI 技術のリサーチ
４．概算の費用対効果の算出
５．PoC 計画の策定

（３）プロジェクト全体のマネジメント支援

１．プロジェクト全体の進捗管理
２．定期的な経営報告の支援
３．AI 共創プロジェクト 26 年度予算の策定支援

５．提案に含めていただきたい事項

１．各タスクにおける進め方

「３．提案依頼事項」に対する具体的なアプローチ、手法、アウトプットイメージ

２．プロジェクト体制

本プロジェクトをハンズオンで推進するための貴社体制。

- Gemini Ent.導入実績を持つ PM・技術メンバーの配置
- 既存システム連携の実装経験（あれば尚可）
- PM および主要メンバーの AI プロジェクトにおける実績（介護・ヘルスケア業界なら尚可）
- 不足リソースを補完する具体的な方法(貴社内人材の活用、パートナー連携等)

３．貴社の強み

本プロジェクトの成功に貢献できる貴社ならではの強み、実績、知見。

AI-ready 化支援の実績、Gemini Ent.導入実績、本プロジェクトの成功に貢献できる貴社ならではの強み、実績、知見

４．費用

各タスクの役割（コンサルタント、エンジニア等）と単価、工数がわかる形で見積もりをご提示ください。

５．留意点

現時点では、各プロジェクトの具体的な作業範囲や工数、期間等の詳細が全て確定しているわけではないため、初期段階における想定体制・必要工数・関与人数・機関の目安をご提示ください。

実際の進行に当たっては、プロジェクトの進行や要件確定に応じて、追加費用や体制変更等について都度協議・合意の上で進行することを想定しています。

コストパフォーマンスだけでなく、提案の質、実現性、プロジェクトを成功に導く体制の

コミットメントを最重要視します。

提案依頼事項（１）（２）（３）は全て一括した発注とならない可能性があるため、各事項それぞれの単価・工数を切り分けて提示してください。
また、一括受注した場合に変更するコスト（例．同じ要員で複数担当することで、コスト低減が図れる場合はその実額等）や効率的な運営に対する工夫などを提示してください。

6． 提案書類提出要領

項目	詳細
提出期限	2025 年●月●日まで
提出方法	電子データ（形式は問いませんが、PDF 形式を推奨します）にて、下記お問い合わせ先メールアドレス宛にご送付ください。
提出先 お問い合せ先	窓口担当者：岡井・真木 メールアドレス：hiroaki.okai@sompocare.com Yuji.maiki@sompocare.com
提案書形式	PDF 形式を推奨（ページ数制限なし）
質問受付	本 RFP の内容にご不明な点がございましたら、上記お問い合わせ先までご連絡ください。
説明会・プレゼンテーション	当社の要望に対する説明や、ご提案いただいた内容について理解を深めるため、別途 1 時間程度の説明会の開催をお願いさせていただく場合がございます。日程等につきましては、個別にご相談させていただきます。
今後のスケジュール	提案書提出：2025 年●月●日 選考・プレゼン：2025 年●月 契約締結：2025 年●月 プロジェクト開始：2025 年 11・12 月～

以上
